

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Alumnos: Jairo Jimenez - Sergio Moya - Santos Canaviri

Docentes: Camila Lambertucci - Luciano Vera

Año: 5to División: 4ta

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Objetivo

Implementar un sistema de seguimiento y control del proyecto mediante la construcción de un cronograma de desarrollo y un tablero Kanban, organizando las tareas del Product Backlog para acompañar la etapa de desarrollo del videojuego.

Consigna

Durante las actividades anteriores cada equipo definió su PMV, elaboró un Product Backlog y realizó una planificación inicial por Sprints.

En esta actividad deberán transformar esa planificación en un sistema de seguimiento que les permita organizar, visualizar y controlar el trabajo durante la etapa de desarrollo.

1. Ajuste de la planificación

A partir del Plan de Sprints elaborado en la actividad anterior, y de la estructura común definida para la materia, revisen y ajusten la distribución de funcionalidades y tareas dentro de los Sprints.

Todos los equipos deberán contemplar el desarrollo de los requerimientos mínimos del proyecto, incluyendo:

- Pantalla de inicio.
- Instrucciones o ayuda.
- Inicio de partida.
- Instancia jugable.
- Sistema de puntaje, progreso o desempeño.
- Pantalla de resultado final.
- Información sobre el proyecto.
- Pruebas y mejoras finales.

Además, cada equipo deberá incorporar los Sprints necesarios para desarrollar las funcionalidades particulares de su videojuego.

2. Construcción del cronograma

Representen la planificación mediante un Diagrama de Gantt.

El cronograma deberá mostrar:

- Los Sprints del proyecto.
- Las fechas estimadas de inicio y finalización.
- Los objetivos principales de cada Sprint.
- Los entregables previstos.

El cronograma deberá abarcar todo el período de **desarrollo** comprendido entre **agosto y octubre**.

3. Construcción del tablero Kanban

Creen un tablero en Trello para gestionar el seguimiento del proyecto.

El tablero deberá contener las siguientes columnas:

- Product Backlog
- Pendiente
- En proceso
- Terminado

A partir del Product Backlog y de la planificación realizada:

- Transformen las funcionalidades e historias de usuario en tareas concretas.
- Creen una tarjeta para cada tarea.
- Asignen responsables.
- Indiquen el Sprint al que pertenece cada tarea.
- Incorporen una fecha estimada de realización.

Todas las tareas deberán cargarse inicialmente en la columna **Product Backlog**.

Importante

Durante la etapa de desarrollo deberán utilizar de forma complementaria:

- El **cronograma** para visualizar la planificación temporal.
- **Trello** para gestionar el avance de las tareas.
- La **planilla de seguimiento** para registrar el trabajo realizado por cada integrante en cada clase.

Las tareas incluidas en el tablero deberán derivarse de los requerimientos, historias de usuario y funcionalidades definidas en las actividades anteriores.

1_ Luego de revisar el PMV, el Product Backlog y la planificación de Sprints, se reorganizaron las tareas para asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos mínimos del proyecto.

Sprint 1 – Base del videojuego

Objetivo: Construir la estructura inicial del juego y permitir que el usuario pueda comenzar una partida y controlar al personaje.

Funcionalidades

- Pantalla de inicio
- Botón iniciar partida
- Movimiento del personaje
- Diseño del primer nivel jugable

Entregable: Versión inicial del juego con pantalla de inicio y nivel básico funcional.

Sprint 2 – Mecánica educativa

Objetivo. Implementar el sistema principal de aprendizaje basado en preguntas sobre la obra Facundo.

Funcionalidades

- Cubos de preguntas
- Preguntas multiple choice
- Verificación de respuestas
- Sistema de puntaje

Entregable: Jugador capaz de responder preguntas y obtener puntos.

Sprint 3 – Finalización del PMV

Objetivo: Completar la experiencia del usuario y preparar el producto para las pruebas finales.


Funcionalidades

- Pantalla de resultado final
- Sección de ayuda e instrucciones
- Información sobre el proyecto
- Pruebas generales
- Corrección de errores y mejoras finales

Entregable: PMV completo y funcional listo para presentación.

DIAGRAMA DE GANTT

PLANIFICACIÓN DE LA AVENTURA DE FACUNDO

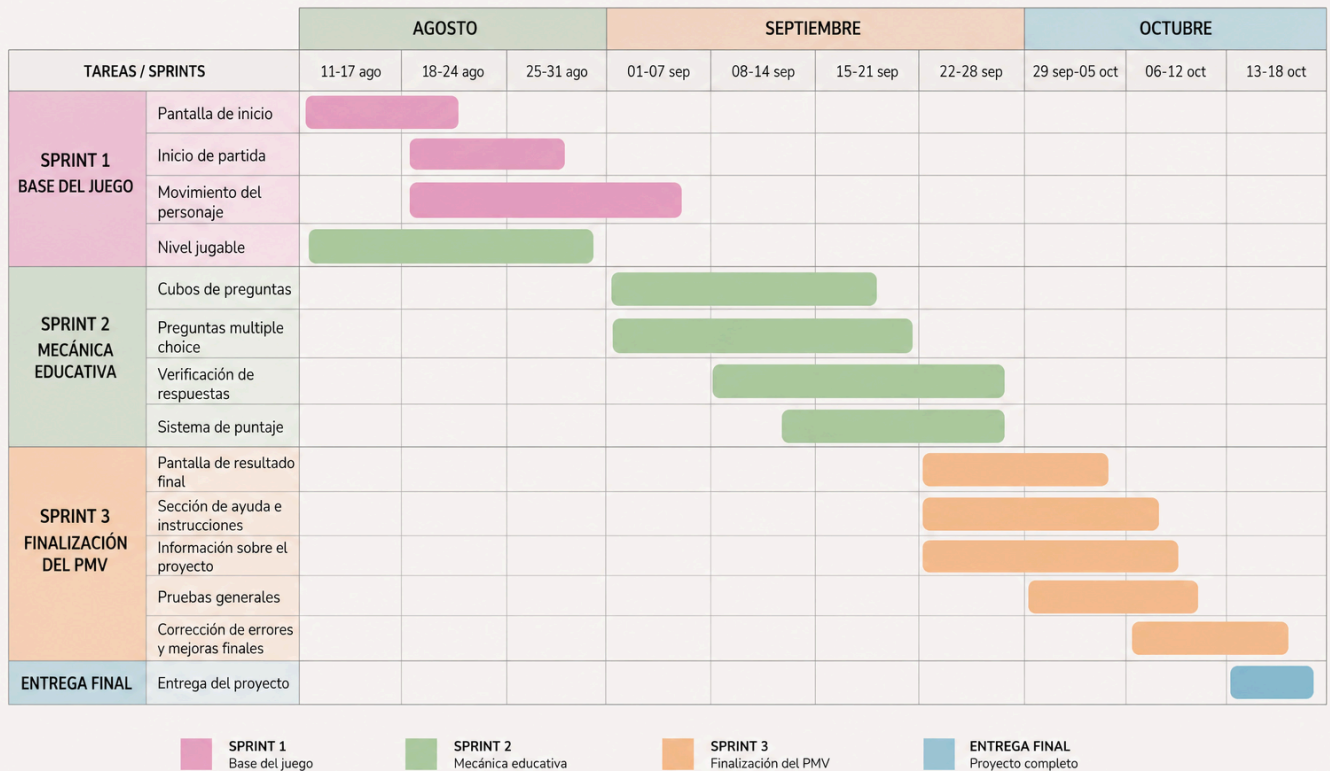

3-<https://trello.com/invite/b/6a39415ded90bf402607f8e9/ATTI3024201487d648e4fd1c3446335dde1fB003C75A/mi-tablero-de-trello>
